



北九州都市計画臨港地区分区指定図

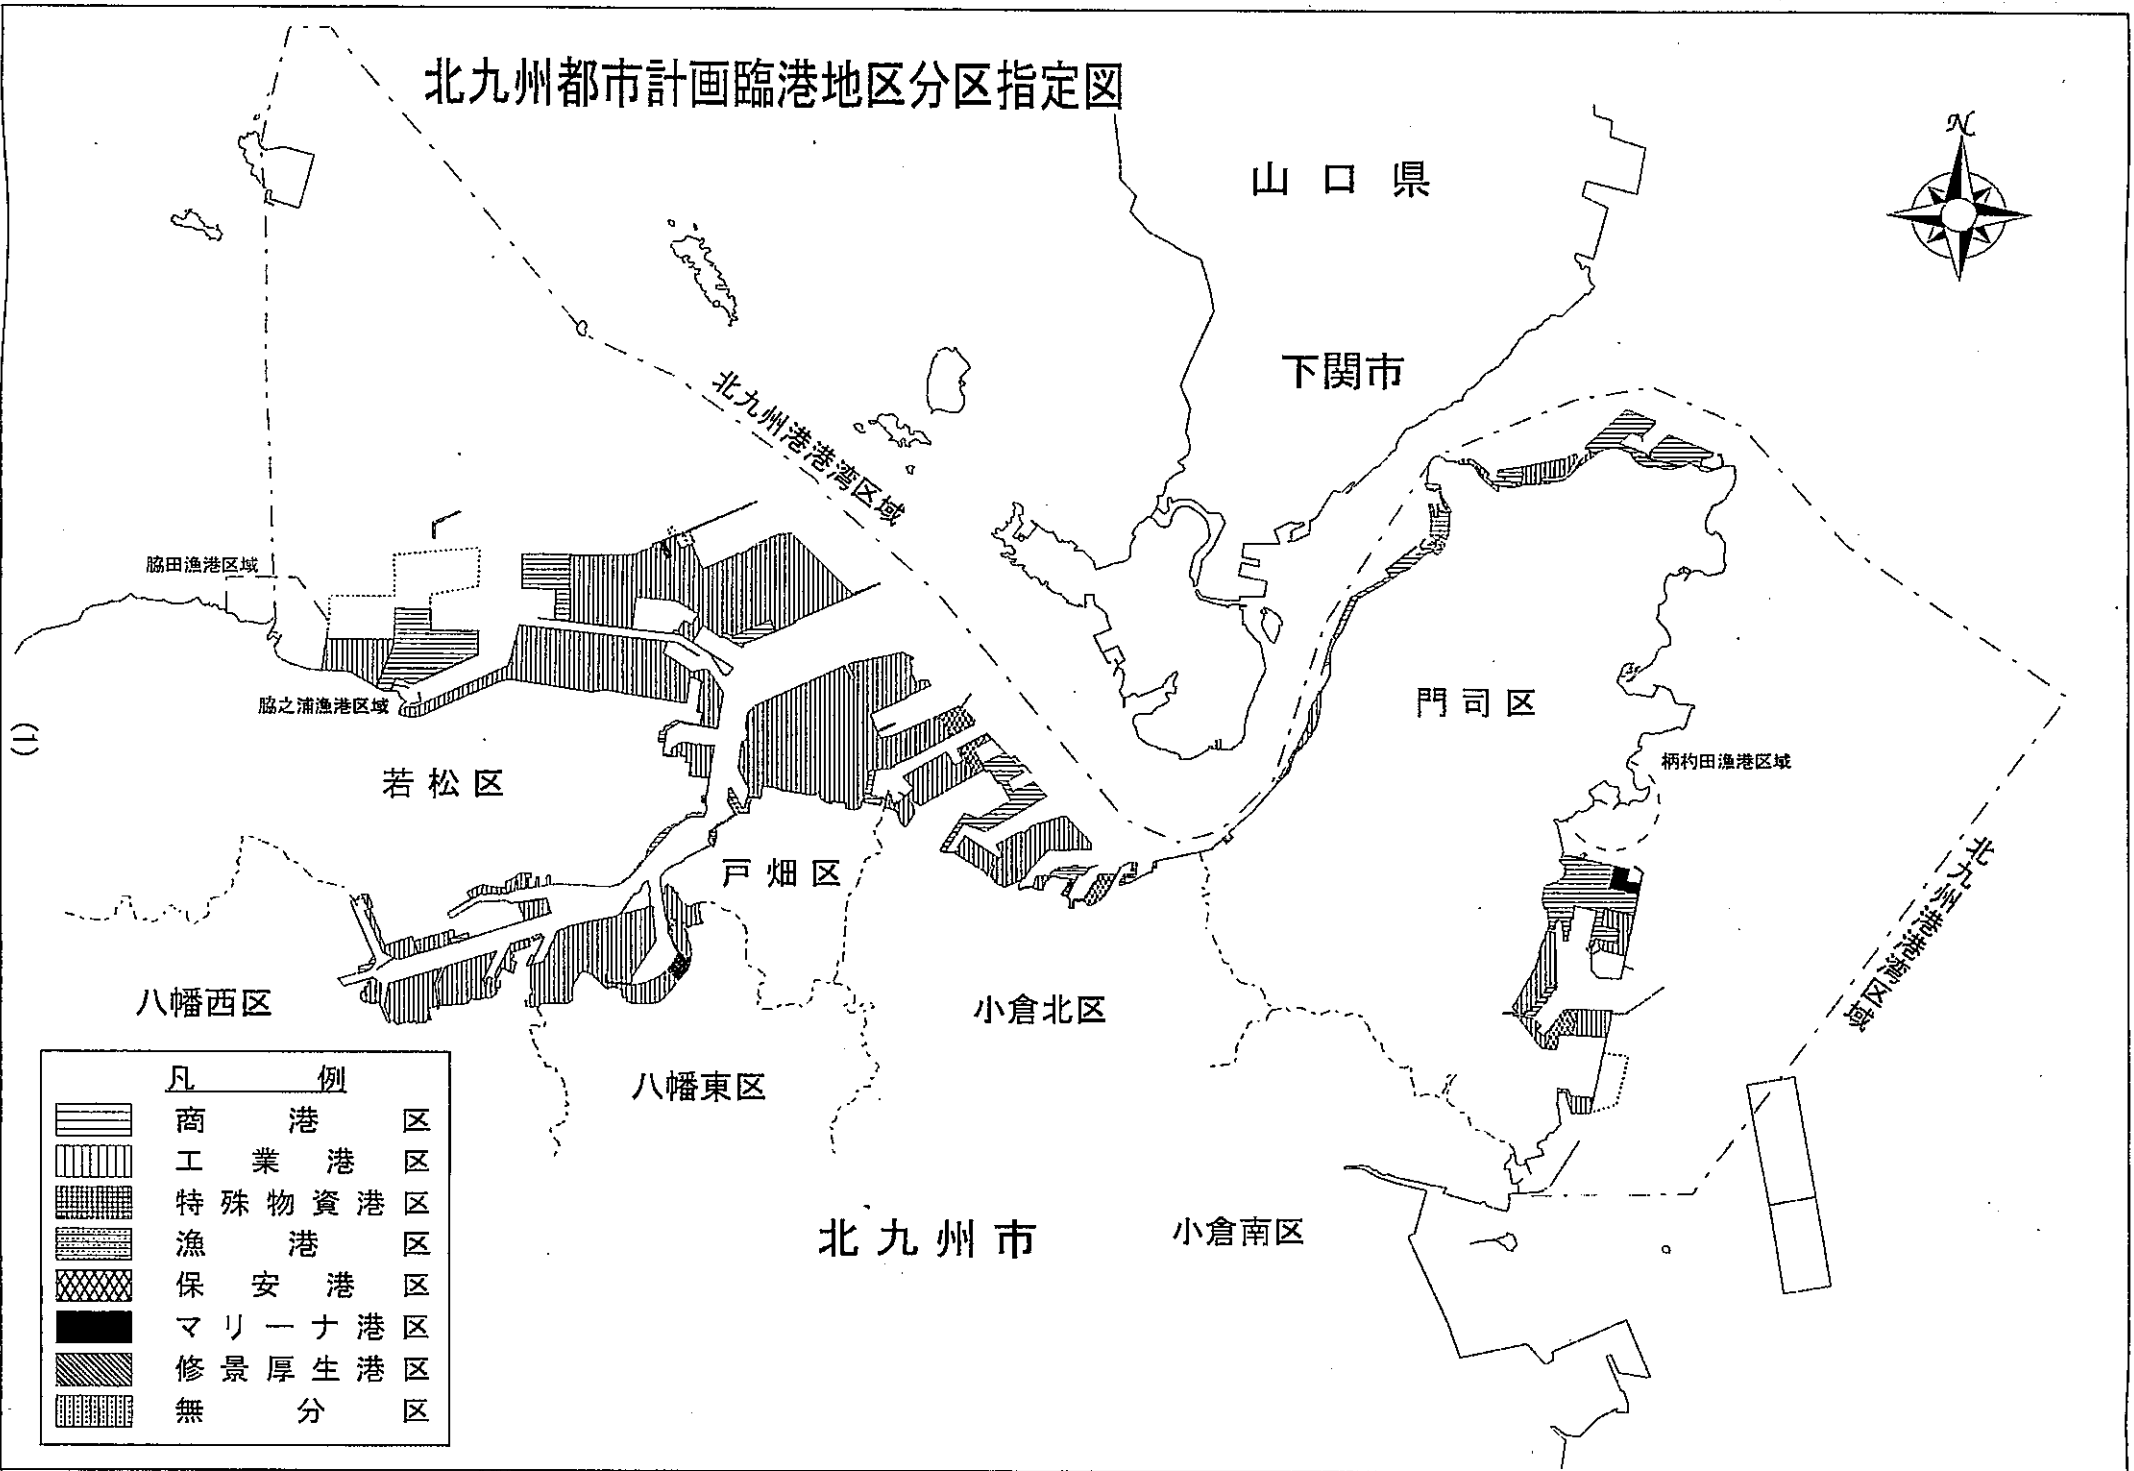

凡 例	
	商 港 区
	工 業 港 区
	特 殊 物 資 港 区
	漁 港 区
	保 安 港 区
	マ リ ー ナ 港 区
	修 景 厚 生 港 区
	無 分 区

(二)

港湾整備の事業区分

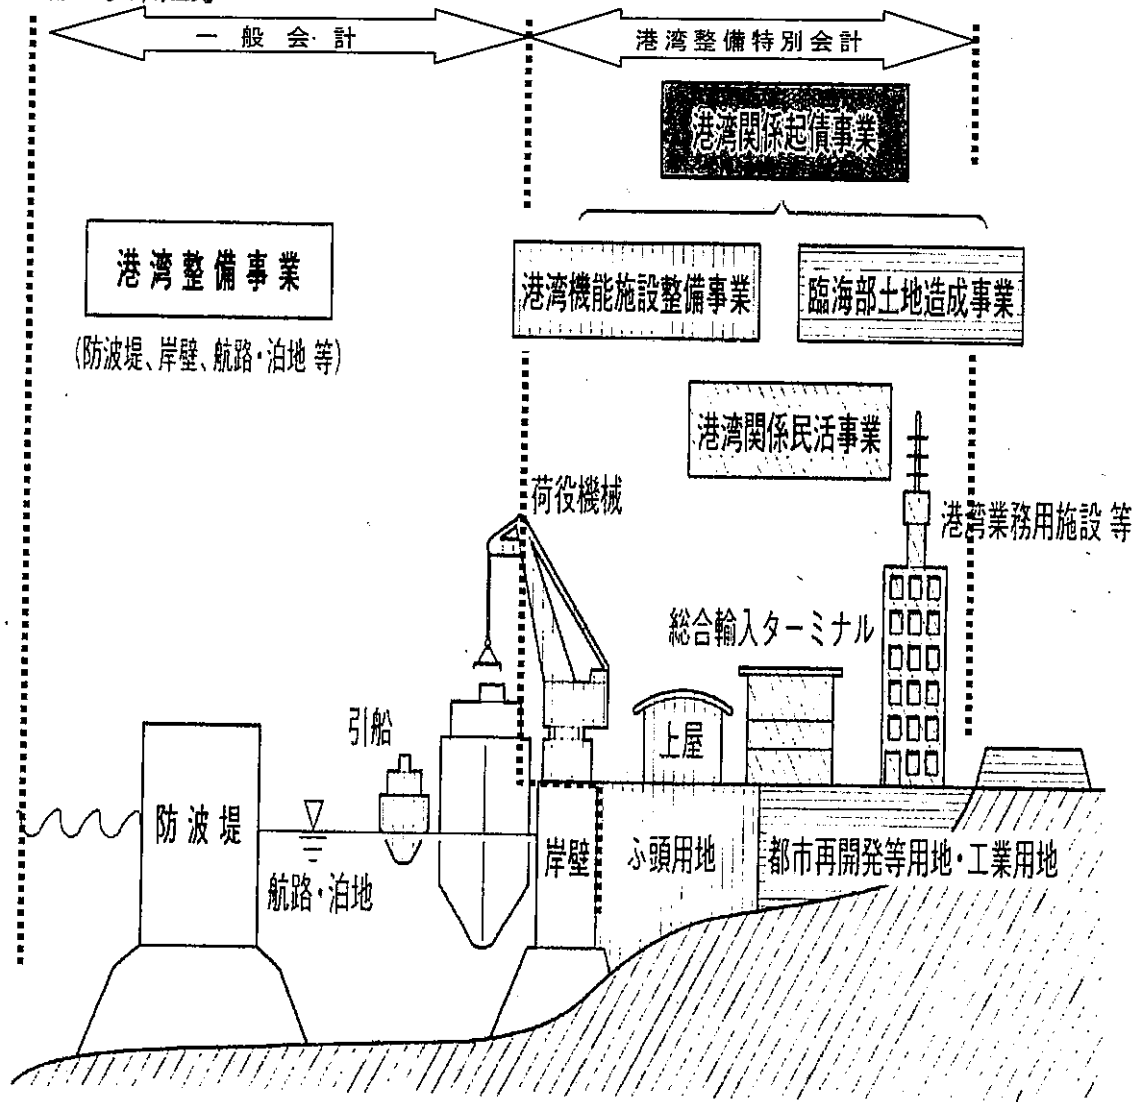

会計	事業区分	施設名	費用負担	
			国費	市費
一般会計	港湾整備事業	岸壁、泊地、航路 防波堤、緑地等	1 / 3 ~ 2 / 3	2 / 3 ~ 1 / 3
		埋立事業	企業立地用地 護岸、区画内道路等	—
港湾整備 特別会計	機能施設事業	臨港鉄道、荷役機械 上屋、荷捌地等	—	全額 (地方債)

■港湾施設の整備状況

現在の北九州港の整備は、平成8年の港湾計画（改訂）に基づいて進められています。
港湾施設の整備状況は下記の通りです。

【港湾施設の整備状況】

(平成16年10月現在)

地区	事業種別	施設	全体計画 (H22目標)	備考
新門司南	港湾整備事業	防波堤	1,070m	未着手
		防波堤撤去	680m	"
		岸壁(-7.5)	2バース 260m	"
		ドルフィン(-7.5)	1基	"
		泊地(-7.5~-9)	318,000㎡	"
		道路	1式	"
		護岸(防波)	358m	"
		廃棄物埋立護岸 ふ頭用地造成	1式 1式	事前調査中 未着手
新門司北	港湾整備事業	岸壁(-10)	2バース 370m	294.9m完了
		泊地(-10)	922,000㎡	暫定水深(-8m)までほぼ完了
		航路(-10)	5,877,000㎡	暫定水深(-8m)200mから300mへ
		泊地(-8)	234,000㎡	完了
		道路	1式	"
		防波堤(新門司マリーナ)	95m	"
		浮棧橋(新門司マリーナ)	1式	"
		緑地(A)	146,000㎡	再評価委員会により事業中止
		緑地(C)(津村島)	59,000㎡	再評価委員会により事業中止
		緑地(D)	18,000㎡	完了
	ふ頭用地造成	1式	実施中	
	工業用地造成	1式	実施中	
	海岸事業	(地蔵面)護岸・人工海浜等	1式	実施中(H16完了予定)
白野江	海岸事業	(青浜)護岸、植栽等	1式	未着手
		(白野江)護岸	740m	実施中(H18完了予定)
太刀浦	港湾整備事業	ふ頭用地造成	1式	完了
田野浦	港湾整備事業	道路(東)	1式	未着手
		道路(西)	1式	"
		物揚場(-3)(PBS)	450m	完了
		岸壁(-10)	1バース 185m	実施中
		岸壁(-9)	1バース 170m	未着手
		港湾関連用地造成	1式	未着手
西海岸	港湾整備事業	(西海岸)岸壁(-11)	1バース 210m	未着手
		(")物揚場(-3)	90m	完了
		(")浮棧橋	1基	"
		(")浮棧橋(2)	1基	"
		(")浮棧橋(3)	1基	"
		(")道路	1式	"
		(")緑地	1式	完了
		(新浜)物揚場(-3)(PBS)	555m	完了
		(")防波堤(1)	60m	"

地区	事業種別	施設	全体計画 (H22目標)	備考
西海岸	港湾整備事業	(〃) 防波堤 (2)	40m	完了
		(〃) 緑地	1式	完了
		(旧門司) 物揚場 (-2)	25m	完了
		(〃) 防波堤	55m	完了
		(〃) 防波堤 (2)	20m	完了
		(小森江) 物揚場 (-3)	70m	未着手
		(〃) 物揚場 (-3) (PBS)	186m	完了
		(〃) 緑地	7,620㎡	未着手
大里	港湾整備事業	物揚場 (-3~-4) (PBS)	282m	完了
		物揚場 (-2)	58m	実施中
		船揚場	12m	実施中
		防波堤	190m	実施中
大里	海岸事業	護岸	618m	実施中 (H17完了予定)
		植栽、遊歩道	1式	〃
砂津	港湾整備事業	岸壁 (-12)	1バース 350m	未着手
		泊地 (-12)	467,000㎡	〃
		泊地 (-10)	23,000㎡	〃
		航路 (-12)	幅員250m	〃
		岸壁 (-7.5)	2バース 340m	完了
		物揚場 (-3)	2バース 280m	未着手
		泊地 (-3)	8,000㎡	〃
		浮棧橋	3基	〃
		浮棧橋 (PBS)	2基	〃
		道路	1式	完了
		緑地	100,000㎡	未着手
		ふ頭用地造成	1式	完了
		港湾関連用地造成	1式	完了
日明	港湾整備事業	岸壁 (-7.5)	260m	再評価委員会により事業中止
		泊地 (-7.5)	45,000㎡	〃
		岸壁 (-5.5)	300m	未着手
		泊地 (-5.5)	52,000㎡	〃
		物揚場 (-4)	390m	完了
		泊地 (-4)	43,822㎡	〃
		物揚場 (-3) (PBS)	300m	未着手
		橋梁	1基	未着手
		緑地	5,309㎡	完了
		荷役機械	2基	〃
ふ頭用地造成	1式	〃		
戸畑	港湾整備事業	岸壁 (-9)	160m	実施中 (H16完成予定)
		泊地 (-9)	21,000㎡	実施中 (H16完成予定)
		岸壁 (-7.5)	130m	完了
		泊地 (-7.5)	1,000㎡	実施中 (H16完成予定)
		船揚場	10m	完了
		浮棧橋	1基	〃
		緑地	6,070㎡	完了

地区	事業種別	施設	全体計画 (H22目標)	備考
戸畑	港湾整備事業	ふ頭用地造成	1式	実施中
		港湾関連用地造成	1式	実施中
洞海湾	港湾整備事業	道路(新若戸)	1式	実施中
八幡	港湾整備事業	浮棧橋	1式	未着手
		物揚場(-3)(PBS)	338m	完了
		緑地	44,000㎡	完了
		道路	1式	完了
黒崎	港湾整備事業	岸壁(-7.5)	2バース 260m	未着手
		泊地(-7.5)	5,000㎡	"
		ふ頭用地造成	1式	"
若松	港湾整備事業	緑地	16,196㎡	完了
	海岸事業	(藤ノ木)護岸等	1式	未着手
響灘東	港湾整備事業	東第1防波堤	900m	(一部)完了(ハブポート)
		東第2防波堤	300m	完了(ハブポート)
		防波堤(マリーナ)	660m	未着手
		防波堤撤去(マリーナ)	50m	"
		岸壁(-13)	2バース 520m	未着手(ハブポート)
		泊地(-13)	34,000㎡	"
		岸壁(-9)	1バース160m	完了
		泊地(-9)	24,700㎡	"
響灘東	港湾整備事業	岸壁(-7.5)	2バース 260m	未着手(ハブポート)
		泊地(-7.5)	71,000㎡	未着手(ハブポート)
		岸壁(-4.5)	520m	"
		岸壁(-5.5)	1バース 100m	実施中(リサイクルポート)
		泊地(-5.5)	19,000㎡	実施中(リサイクルポート)
		浮棧橋(マリーナ)	6基	未着手
		船揚場(マリーナ)	40m	"
		橋梁	1基	"
		道路	1式	実施中
		緑地(東)	36,000㎡	未着手
		緑地(中央)	68,000㎡	完了
		緑地(水路)	27,000㎡	未着手
		緑地(北)	283,000㎡	実施中
		緑地(南)	249,000㎡	未着手
		廃棄物埋立護岸	1式	完了
		ふ頭用地造成	1式	未着手
		港湾関連用地造成	1式	実施中
		工業用地造成	1式	"
ふ頭用地(マリーナ)	1式	未着手		
上屋(マリーナ)	1棟	"		

地区	事業種別	施設	全体計画 (H22目標)	備考
響灘西	港湾整備事業	西第1防波堤	1,250m	完了 (ハブポート)
		西第2防波堤	240m	完了 (ハブポート)
		防波堤	450m	実施中 (第3船溜まり)
		航路 (-16)	1,348,160m ²	完了 (ハブポート)
		岸壁 (-15)	700m	完了 (ハブポート)
		泊地 (-15)	1,645,000m ²	実施中 (ハブポート)
		岸壁 (-12)	250m	未着手 (ハブポート)
		岸壁 (-10)	340m	完了 (ハブポート)
		泊地 (-10)	199,200m ²	完了 (ハブポート)
		岸壁 (-5)	160m	完了 (ハブポート)
		岸壁 (-5)	150m	実施中 (第3船溜まり)
		物揚場 (-4)	450m	未着手
		物揚場 (-3)	685m	実施中 (H16完了予定) (第3船溜まり)
		船揚場	35m	完了 (第3船溜まり)
		緑地	47,000m ²	未着手
		道路	1式	実施中 (ハブポート)
		橋梁	1基	未着手
		廃棄物埋立護岸	1式	完了
ふ頭用地造成	1式	実施中 (ハブポート)		
港湾関連用地造成	1式	〃		
