

低地ポンプ施設台帳

Ver. 2020年3月

全体位置図

門 司 区

小倉北区

小倉南区

若 松 区

八幡東区

八幡西区

戸 畑 区

一覧表表示

門 司 区

小倉北区

小倉南区

若 松 区

八幡東区

八幡西区

戸 畑 区

作業ドライブ

作業ドライブの変更

終 了



行政区	施設番号	施設名称	処理区	処理分区	人孔番号 (道管)	設置年度	排水面積 (ha)	流入量 (m ³ /分) (ポンプ吐出量)	貯留可能時間 (分)	運転水位 (m)	対象排水戸数			圧送管			備考	
											計画戸数 (戸)	現在戸数 (戸)	現在水洗 化戸数 (戸)	口径(mm)	条数	延長(m)		
門司区	〔排水種別:汚水〕																	
	A-1	大 積	新 町	黒 川		H.7 H.24改築	6.29	0.084	70	0.71		20	8	75	2	13	H.25 自動通報装置取替	
	A-2	柄 杓 田 第 1	〃	柄杓田特環		H.7 H23改築	29.00	0.684	368	-5.00			1	150	2	829	H.23 自動通報装置取替	
	A-3	柄 杓 田 第 2	〃	〃		H.7 H23改築	0.00 (29.00)	0.060 (0.744)	98	3.2		1	0	〃	2	417		
	A-4	柄 杓 田 第 3	〃	〃		H.7 H23改築	15.00 (44.00)	0.228 (0.972)	115	2.16			11		〃	2	955	
	A-5	柄 杓 田 第 4	〃	〃		H.7 H23改築	0.00 (44.00)	0.00 (0.972)	中継ポンプ	23.75		0	—	〃	2	284		
	A-6	吉 志 五 丁 目	曽 根	吉 志		H.6 H.24改築	1.44	0.018	39	33.95		6	4	75	2	11		
	A-7	白 野 江 第 1	新 町	門 司	1726-22-804	H.10 H.26改築	1.07 (2.68)	0.077(0.193)	0.7	73.7		15	14	75	2	208		
	A-8	白 野 江 第 2	〃	〃	1726-23-800	H.10	1.61	0.116	1.2	56.44		16	14	75	2	221		
	A-9	黒 川 西 一 丁 目	〃	黒 川	1826-51	H.13	0.37	0.018	不明	23.2		12	7	75	2	68		
	A-10	伊 川 (そ の 1)	曽 根	伊川特環	2026-30-800	H.10	89.83	1.013	不明	-2.70		478	74	150	2	294	H.21 自動通報装置取替	
	A-11	猿 喰	〃	〃	2126-20	H.12	146.21	1.125	45.1	-6.70		225	33	250	2	606	H.27 流入スクリーン設置	
	A-12	伊 川 (そ の 2)	曽 根	伊川特選		H.13	18.27	0.114	123.3	1.03		12	9	75	2	90		
	A-13	新門司北三丁目	曽根	吉志		H.13	93.97	1.410	118	-1.50		2	0	150	1	798		
	A-14	伊 川 第 1	曽 根	伊川特環		H.18		0.265	415	25.77		19	13	75	1	43		
	A-15	伊 川 第 2	〃	伊川特環		H.18		0.265	245	34.85		11	8	75	1	27		
	A-16	畑	〃	吉 志		H.19		不明	215	36.67		3	3	75	1	105		
	A-17	白 野 江	新 町	青浜特環		H.16		0.283	241	2.42		57	18	150	2	1900 (図面計測)		
	A-19	新 門 司 二 丁 目	曽 根	吉 志		H.22		(1.03)		-4.92		1	1	150	2	56.23		
	〔排水種別:雨水〕																	
A-18	吉 志 雨水排水ポンプ場	櫛毛川	吉 志		H.23		(131.00)		HWL ▽+1.50		—	—	—	—	—	—		
A-20	恒 見 雨水排水ポンプ場	〃	相割川		H.27		(34.20)		+1.82		—	—	—	—	—	—		
A-21	恒 見 町 (そ の 2) 雨水排水ポンプ	〃	〃		H23		4.5						250	1	21.3			

※排水面積・流入量の欄の数値は、当該ポンプ区域を示し、
()内数値は、多段式による上流部を含む数値を示す。

位置図 (A-1)

問同凶


大積 低地ポンプ



圧送管ルート図 (A-1)

門 司 区

大積 低地ポンプ

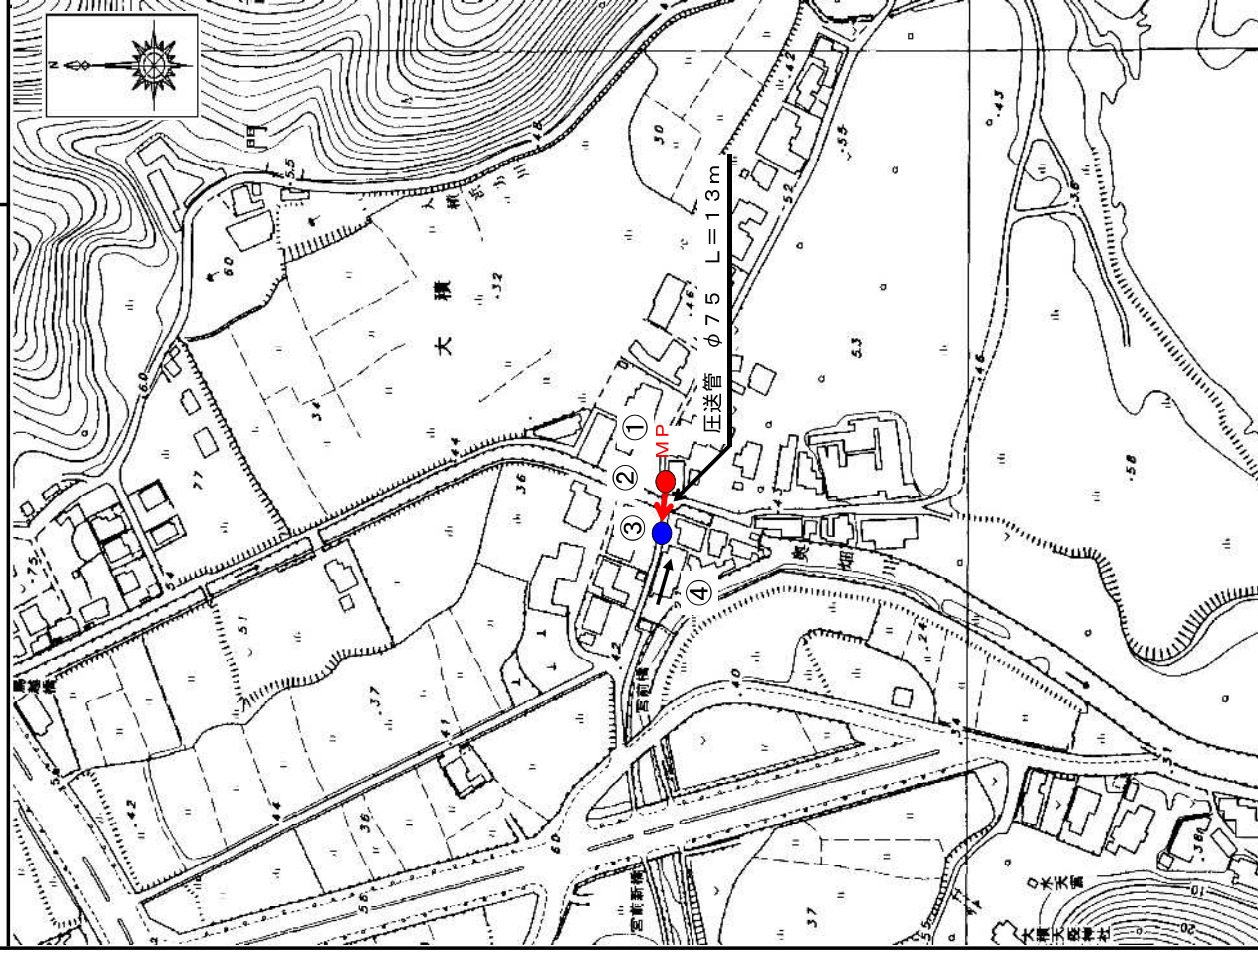

①



MP

②



③



着水M

④



着水M

要補修度ランク	D
---------	---

要補修度ランク	D
---------	---

歷履修補

[illegible]

低地ポンプ施設台帳

施設番号	A-1	施設名称	大 積	処理区	黒川	処理分区
------	-----	------	-----	-----	----	------

米 土

土		木	
工事番号	07-1308		
工事名	大積地内(その2) 管渠築造工事		
設置場所	門司区大字大積		
施工業者			
完成年度	平成 7 年度	運転開始年度	平成 8 年度

設備施設

人孔番号	排水面積	排水種別	雨水合流
当該排水面積	6.29 ha	流入量	0.084 m ³ /分
排水面積 (当該排水面積含む)	— ha	流入量	— m ³ /分
ポンプ井内寸法	φ1.50×3.22H(m)	容量	m ³
防食対策の有無	(有) 無	防食仕様	タールエポキシライニング
貯留可能時間	70 分	排水戸数	戸
現在家屋戸数	20 戸	現在水洗化戸数	H9年 月現在 8 戸
自動通報装置の有無	(有) 無	電話番号	
非常通報先		電話番号	
		電話番号	

管 送 压

圧送形態 (段数)	1段	多段 (段)	口 径	75 mm
延長	長	13	m 条	2 条
高低差	差		m 空 気 弁	0 個所

ル
ー
ホ
ン
マ
水
着

下流管種	①	VU	②	VU	③	VU	④	VP	⑤	VU
下流口徑	①	150	②	150	③	150	④	150	⑤	150
防食対策の有無	①	有	・	無	防食仕様 ターレポキシライニング					
	②	有	・	無	防食仕様 ——— 種					
	③	有	・	無	防食仕様 ——— 種					
	④	有	・	無	防食仕様 ——— 種					
	⑤	有	・	無	防食仕様 ——— 種					

電氣設備改築

氣 電 機 機

ポンプ No. 1		ポンプ No. 2	
設置年度		設置年度	
工事名		工事名	
施工業者		施工業者	
メーカー名		メーカー名	
形式		形式	
定格出力	KW	定格出力	KW
口径	mm	口径	mm
吐出量	m ³ /min	吐出量	m ³ /min
揚程	m	揚程	m
電圧	V	電圧	V
電流	A	電流	A
絶縁種別		絶縁種別	

自動通報裝置

[illegible]

ポンプ制御装置

[illegible]

到 展

施設名	ポンプ井	制御盤
所有者		
場所		民地内
面積	m ²	4.2 m ²
占用料		
